

Ciudad de México, 22 de julio de 2022  
Oficio Núm. SUI/2022-3331-1  
Referencia: DGESUI- 22-003193  
DFI-4797-22  
Asunto: Informe de avance FAM 2022

**L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ**  
RECTOR  
INSTITUTO CAMPECHANO  
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo, hago referencia a su atento oficio No. RIC/452/2022, de fecha 4 de julio del año en curso, mediante el cual envía el informe de avance de las obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2022, de la institución que dignamente dirige, correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) de 2022.

De acuerdo con el reporte remitido, la institución informa que:

1. Para la obra apoyada, el monto ejercido es de \$3,001,591.38 (Tres millones un mil quinientos noventa y un pesos 38/100 M.N.), un remanente de \$8,247,577.62 (Ocho millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos setenta y siete pesos 62/100 M.N.) y un avance físico de 8.00%, se observa que no se reportaron las fechas de ejecución, favor de incluirlas en el próximo reporte, de acuerdo con sus observaciones la obra inició el 20 de junio de 2022.

FAM 2022							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
2	Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán	11,249,169.00	3,001,591.38	8,247,577.62	8.00	20-06-22	S/D
<b>Total</b>		<b>11,249,169.00</b>	<b>3,001,591.38</b>	<b>8,247,577.62</b>	<b>8.00</b>		

Es importante destacar que los recursos deben ejercerse conforme a lo establecido en el Art. 17 de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que deberán comprometerse, devengarse y/o ejercerse a más tardar el 31 de diciembre del año en que se otorgó el recurso. En caso de comprometer el recurso, este deberá pagarse a más tardar al 31 de marzo del año siguiente, sin posibilidad de prórroga.

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes.

Atentamente




Dr. Eduardo Gerardo Rosas González  
Director

S. E. P.  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
EDUCACIÓN SUPERIOR

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Av. Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 28, Col. Xoco, C.P. 03330, CDMX.  
Tel: +52 (55)3601 3331 y 3332 dgesui.ses.sep.gob.mx



Oficio Núm. 511/2022-3331-1

**SIN TEXTO**

Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono

- C.c.p. Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, SES. – Para su conocimiento ☑  
 Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. – Para su conocimiento ☑  
 M.C. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del Instituto Campechano. – Para su conocimiento ☑  
 Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del Instituto Campechano. – Para su conocimiento ☑

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 28, Col. Xoco, C.P. 03330, CDMX.  
 Tel: +52 (55)3601 3331 y 3332 dgesui.ses.sep.gob.mx







Instituto  
Campechano

**RECTORÍA**



OFICIO: RIC/452/2022

ASUNTO: Informe FAM 2do. trimestre 2022.

San Francisco de Campeche, Camp., a 04 julio de 2022.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN**  
**SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.**  
**PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2021-0826-05 del 18 de febrero del año 2022, enviado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (**FAM**) 2022, proyecto: "Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán", por un monto asignado de \$11,249,169.00; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del **2do. trimestre** del año 2022, en formato PDF y Excel.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

  
LAE. GERARDO MONTERO PEREZ  
RECTOR



**RECTORÍA**

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.  
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.  
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche.  
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI.  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC.  
M. C. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.  
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.  
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C.  
C.c.p. Archivo/ccv.



2022

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**2do. TRIMESTRE**  
FECHA DE CORTE: ABRIL A JUNIO

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **INSTITUTO CAMPECHANO**

Entidad federativa: **CAMPECHE**

Clave Inst 911: **04MSU030F**

RESPONSABLES

Nombre: **M.C. Maribel Bautista Álvarez**  
Cargo: **Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad**  
Teléfono: **981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154**  
Correo electrónico: **planeacion@instcamp.edu.mx**

Nombre: **Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo**  
Cargo: **Directora General de Administración**  
Teléfono: **981 81 62480 Ext. 102 y 105**  
Correo electrónico: **sevadm@instcamp.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada				
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Cuenta con Actas		Monto de Acta Administrativa
																						Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	
2	Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán	X					\$11,249,169.00	\$ 3,001,591.38	\$ 8,247,577.62	Aulas	6	311	Se realizó el trazo y se inició la excavación del edificio b, así como el armado de columnas de la nevería	8%	GLOBAL DEL PROYECTO		La obra ya fue licitada por el INIFEEC, la fecha de entrega del sitio de los trabajos por parte del Instituto fue el día 17 de junio del 2022, según oficio DCSO-100-2022. La fecha de inicio fue el día 20 de junio del 2022 en la cual se realizó un recorrido con personal del INIFEEC, del Contratista y del Instituto.							
									Áreas comunes (nevería, cocina, pasillos, escaleras, plaza cívica, estacionamiento y áreas verdes)	8	3758													
									TOTAL	14	4069.00													
							\$11,249,169.00	\$3,001,591.38	\$8,247,577.62															

Lic. Gerardo Montero Pérez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



2022

AÑO

Mes reportado

**2do. TRIM**

FECHA DE CORTE: ABRIL A JUNIO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD: **2** Nombre de la obra: **Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchaká**




Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

**8%**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

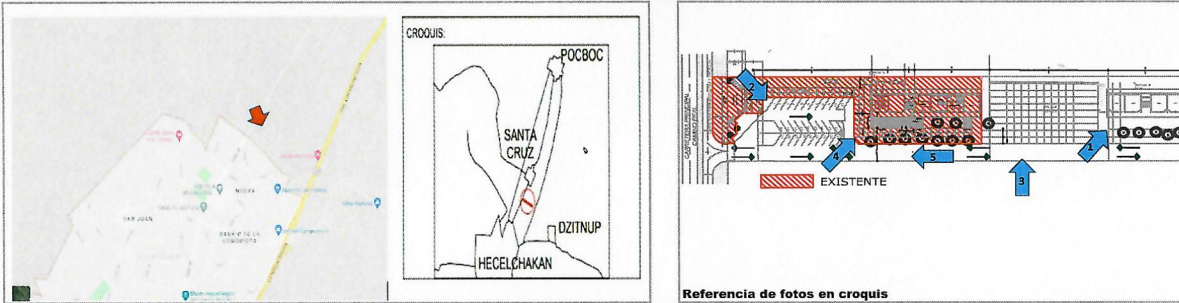

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección Postal: 24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche.

FOTOS



F1: Edificio B



F2: Estacionamiento

Comentarios de los trabajos realizados:

Avance del 8 % de obra.



F3: Plaza Cívica



F4: Nevería



F5: Carril de acceso

Lic. Gerardo Montero Pérez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. Wilfrido Elías Hernández Castillo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
