



Instituto
Campechano

RECTORÍA



OFICIO: RIC/022/2023

ASUNTO: Informe FAM 4to. trimestre 2022

San Francisco de Campeche, camp. a 09 de enero de 2023.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención al oficio 511/2021-0815-05 del 18 de febrero del año 2022, enviado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022, proyecto: "Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán", por un monto asignado de \$11,249,169.00; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar impreso y USB con el informe del **4to. trimestre del año 2022, en formato PDF y Excel.**

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano



RECTORÍA



- C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
L.T.S- Raquel Castilla Sandoval. - Directora General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular de la DIC del I.C.
Archivo.





Dirección General de Planeación y Calidad <planeacion@instcamp.edu.mx>

RE: [Externo] CUARTO TRIMESTRE FAM 2022 .- INSTITUTO CAMPECHANO

1 mensaje

Claudia Dueñas Ramírez <claudia.duenas@nube.sep.gob.mx>
Para: Dirección General de Planeación y Calidad <planeacion@instcamp.edu.mx>

16 de enero de 2023, 12:47

Buenas tardes, por instrucciones del Arq. Carlos Sánchez Mendoza, Jefe del Departamento de Infraestructura Física, acuso de recibido el 4o. Informe Trimestral, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2022.

Claudia Dueñas Ramírez

Analista del Departamento de Infraestructura Física.

LEYENDA DE CONFIDENCIALIDAD De conformidad con el inciso a) del Artículo 57 del "Acuerdo por el que se emiten las políticas y disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la seguridad de la información en la Administración Pública Federal" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre del 2021. La información contenida en correos institucionales, es de carácter confidencial y su tratamiento es con estricta observancia a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

De: Carlos Enrique Sánchez Mendoza <cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx>
Enviado el: jueves, 12 de enero de 2023 01:48 p. m.
Para: Claudia Dueñas Ramírez <claudia.duenas@nube.sep.gob.mx>
CC: Jesus Carlos Villa Leal <jcarlosv@nube.sep.gob.mx>
Asunto: RV: [Externo] CUARTO TRIMESTRE FAM 2022 .- INSTITUTO CAMPECHANO



Arq. Carlos Enrique Sánchez Mendoza
Jefe de Departamento de Infraestructura Física

Av. Universidad 1200, Sector 5-27, Col. Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX
Teléfono: (55) 3600 2511 Ext. 65644

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural
Dirección de Gestión de Proyectos Tecnológicos

De: Dirección General de Planeación y Calidad <planeacion@instcamp.edu.mx>

Enviado el: lunes, 9 de enero de 2023 12:39 p. m.

Para: Eduardo Gerardo Rosas González <eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx>

CC: Carmen E. Rodríguez Armenta <carmen.r@nube.sep.gob.mx>; María del Rocío Chávez Mayo <rocioc@nube.sep.gob.mx>; Carlos Enrique Sánchez Mendoza <cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx>

Asunto: [Externo] CUARTO TRIMESTRE FAM 2022 .- INSTITUTO CAMPECHANO

Precaución: Este correo se originó desde fuera de la Institución. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y tenga conocimiento que el contenido es seguro.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

Por instrucciones de la rectora y en atención al oficio 511/2021-0826-05 del 18 de febrero del año 2022, enviado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022, proyecto: “Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán”, por un monto asignado de \$11,249,169.00; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo informe del **4to. trimestre del año 2022, en formato PDF y Excel.**

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ

Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad

Calle 10 No. 357 entre 63 y 65, Col Centro, C.P. 24000

San Francisco de Campeche, Campeche, México

Tel. directo 981 81 1 0397 Conmutador 981 81 6 62 14 Ext. 154

Correo: maribel.bautista@instcamp.edu.mx



Instituto
Campechano

RECTORÍA



OFICIO: RIC/022/2023

ASUNTO: Informe FAM 4to. trimestre 2022

San Francisco de Campeche, camp. a 09 de enero de 2023.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2021-0826-05 del 18 de febrero del año 2022, enviado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022, proyecto: "Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán", por un monto asignado de \$11,249,169.00; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar impreso y USB con el informe del **4to. trimestre del año 2022, en formato PDF y Excel.**

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGEUI
L.T.S- Raquel Castilla Sandoval. - Directora General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C
Archivo.

2022



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
4to. TRIMESTRE
FECHA DE CORTE OCTUBRE A DICIEMBRE

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO
Entidad federativa: CAMPECHE
Clave Inst 911: 04MSU0030F
Nombre: Dra. Maribel Bautista Álvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@instcamp.edu.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.T.S Raquel Castilla Sandoval
Cargo: Directora General de Administración
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: servadm@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada																						
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	Cuenta con Actas																					
2	Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán	X				\$11,249,169.00	\$ 9,618,051.22	\$ 1,631,117.78	Aulas	6	311	Se finalizó la construcción del edificio B, así como la plaza cívica, nevería y obra exterior. Todos los trabajos referentes al proyecto se han concluido.		100%	20/08/22	31/12/22	El avance físico de la obra es del 100%.																								
									Áreas comunes (nevería, cocina, pasillos, escaleras, plaza cívica, estacionamiento y áreas verdes)	8	3758																														
									TOTAL	14	4089.00																														

LICDA. ILSA DER RÍZ CERVERA ECHEVERRÍA
Nombre y firma del Titular de la IES

LICDA. RAQUEL CASTILLO SANDOVAL
Obras y Mantenimiento

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
4to. TRIM
FECHA DE CORTE: OCTUBRE A DICIEMBRE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchaká**



Escudo de la universidad
Porcentaje de avance

100%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

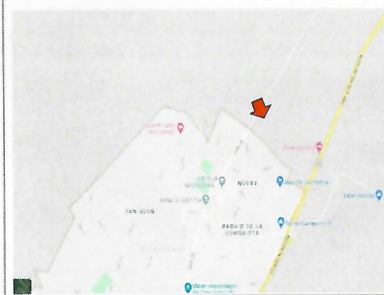

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección Postal: 24800 Carretera Santa Cruz,
Hecelchakán, Campeche.

FOTOS




F1: Edificio B



F2: Edificio B y Cerca Perimetral

Comentarios de los trabajos realizados:

Avance del 100 % de obra.

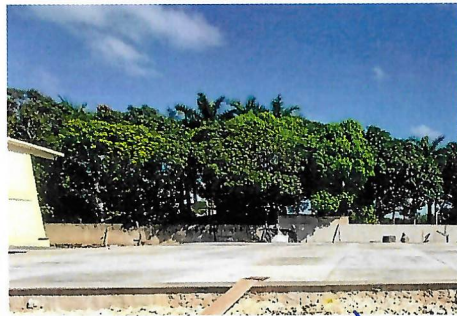

F3: Plaza Cívica



F4: Nevería

LICDA. ILSA BEATRIZ SERRERA ECHEVERRÍA
Nombre y firma del Titular de la IES

LICDA. RAQUEL G. CASTILLA SANDOVAL
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
