

Ciudad de México, 21 de abril de 2022
Oficio Núm. 511/2022-1896
Referencia: DFI-2446, 2475-22
Asunto: Informes de avance FAM 2021, 2022

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR
INSTITUTO CAMPECHANO
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo, hago referencia a sus atentos oficios Nos. RIC/267/2021 y RIC/268/2021, de fecha 4 de abril del año en curso, mediante los cuales envía los informes de avance de las obras apoyadas a través de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicios fiscales 2021 y 2022, de la institución que dignamente dirige, correspondiente al primer trimestre (enero-marzo) de 2022.

De acuerdo con el reporte remitido, la institución informa que:

- Para la obra apoyada con recursos del FAM ejercicio 2021, el monto ejercido es de \$3,529,605.77 (Tres millones quinientos veintinueve mil seiscientos cinco pesos 77/100 M.N.), un remanente de \$4,029,508.01 (Cuatro millones veintinueve mil quinientos ocho pesos 01/100 M.N.) y un avance físico de 46.00%, favor de actualizar fecha de término.

FAM 2021							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
1	Construcción de Auditorio Multifuncional en el Campus V	7,559,113.78	3,529,605.77	4,029,508.01	46.00	23/08/21	25/03/22
Total		7,559,113.78	3,529,605.77	4,029,508.01	46.00		

De acuerdo con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), instancia ejecutora de la obra, con base en el oficio INIFEEC/DG/037/2022 del 5 de abril existe un avance del 46% en forma general del inmueble a construir, es importante referir que a través del oficio número INIFEEC/DG/090/2022 de fecha 24 de marzo, se ha notificado a este Instituto del proceso de rescisión de contrato y por lo tanto de los reintegros a efectuarse de recursos no ejecutados.

Con similar No. 511/2022-1736, se tomó nota que, los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples ejercicio fiscal 2021, se comprometieron antes del 31 de diciembre del año 2021, en conformidad con el Art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- La obra apoyada con recursos del FAM ejercicio 2022, no se ha iniciado debido a que, se están realizando las gestiones con el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) para la firma del Convenio de Ejecución de la Obra.

FAM 2022							
No.	Obra	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance físico	Fecha inicio	Fecha término
2	Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán	11,249,169.00	0.00	11,249,169.00	0.00	S/D	S/D
Total		11,249,169.00	0.00	11,249,169.00	0.00		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
Av. Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 28, Col. Xoco, C.P. 03330, CDMX.
Tel: +52 (55)3601 3331 y 3332 dgesui.ses.sep.gob.mx



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Educación Superior
Universitaria e Intercultural
Dirección de Fortalecimiento Institucional

Oficio Núm. 511/2022-1896

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes.

Atentamente



Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

- C.c.p. Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, SES. – Para su conocimiento ☑
Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. – Para su conocimiento ☑
M.C. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del Instituto Campechano. – Para su conocimiento ☑
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del Instituto Campechano. – Para su conocimiento ☑
. – Para su conocimiento ☑

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Av. Universidad No. 1200, Piso 5. Sector 28. Col. Xoco. C.P. 03330, CDMX.

Tel: +52 (55)3601 3331 y 3332 dgesui.ses.sep.gob.mx

CERA/EGRC/RCHM/cesm/cv

2 de 2



2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Instituto
Campechano

RECTORÍA



OFICIO: RIC/268/2022.

Asunto: **Informe FAM 1er. trimestre
2022**

San Francisco de Campeche, Camp., 4 abril de 2022

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
P R E S E N T E-.**

En atención al oficio 511/2021-0826-05 del 18 de febrero del año 2022, enviado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples **(FAM) 2022**, proyecto: "Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán", por un monto asignado de \$11,249,169.00; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del **1er. trimestre** del año 2022, en formato PDF y Excel.

Sin otro particular, le envió un saludo cordial.

ATENTAMENTE

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"


ATENTAMENTE
L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR



RECTORÍA

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Mtra. María del Rocio Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC
M. C. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General de Finanzas del I.C.
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C.
Archivo.

C.c.p.- Archivo/ecs.



2022

ANO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

1er. TRIMESTRE

FECHA DE CORTE: ENERO A MARZO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO

Entidad federativa: CAMPECHE

Clave Inst 911: 04MSU0030F

RESPONSABLES

Planeación
Nombre: M.C. Maribel Bautista Álvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@instcamp.edu.mx

Obras y Mantenimiento
Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo
Cargo: Directora General de Administración
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: servadm@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa	
2	Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchaká	X					\$11,249,169.00	\$ -	\$ 11,249,169.00	Aulas Áreas comunes (nevería, cocina, pasillos, escaleras, plaza)	6 8	311 3758			0%	GLOBAL DEL PROYECTO		A la fecha no existen avances físicos y financieros, la notificación de autorización del recurso FAM, se recibió el 18 de febrero. Los metros cuadrados a construir son 4069 (aulas 311, áreas comunes 3758), se ajustaron en espacios de acuerdo al monto autorizado. Nos encontramos realizando las gestiones con el INIFECC para la firma del Convenio de Ejecución de la Obra, esto con base en el oficio SEDUC/SEMSyS/DGPO/046/2022 del 8 de marzo del 2022, firmado por el M.C. Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Campeche del Secretario de Educación del Estado de Campeche. El recurso no ha sido dispersado a la cuenta bancaria de la institución							
							\$11,249,169.00	\$0.00	\$11,249,169.00	TOTAL	14	4069.00													

Genaro
L.A.E. Genaro Romero Pérez

Nombre y firma del Titular de la IES

María Elizabeth Fuentes Castillo
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo

Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

1er. TRIM

FECHA DE CORTE: ENERO A MARZO

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIMORDIAL 2 Nombre de la obra: Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchaká






Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

0%

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

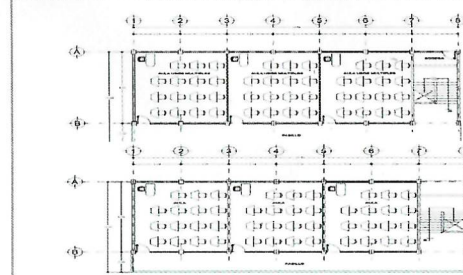


Revisión de planos en campo


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección Postal: 24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche.

FOTOS

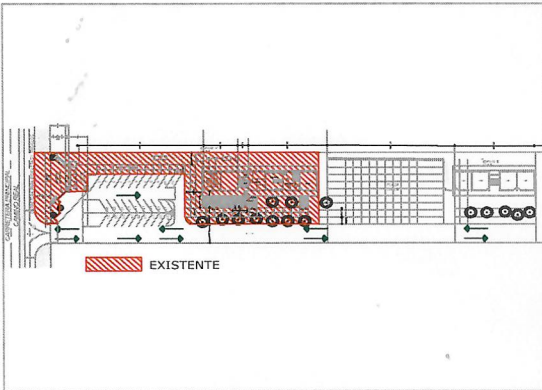


F1: Plano de conjunto

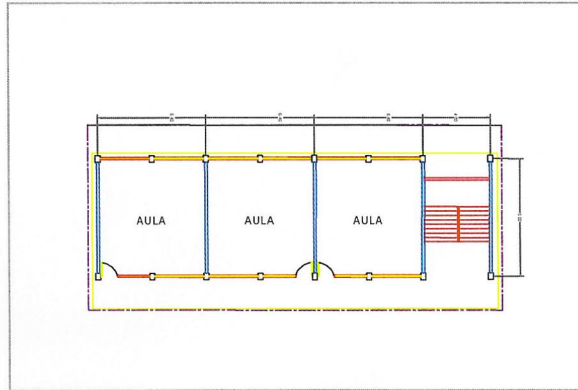


F2: Planta Arq. Edificio B

Comentarios de los trabajos realizados:


Avance del 0 % de obra.

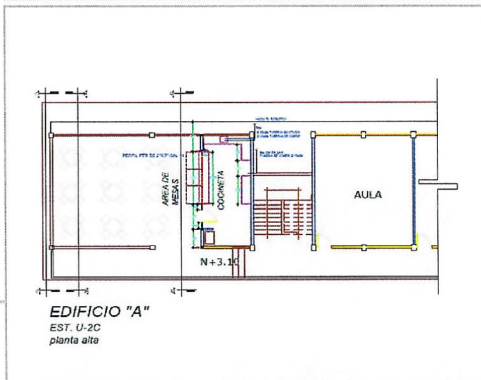

F3: Planta Arq. Nevería

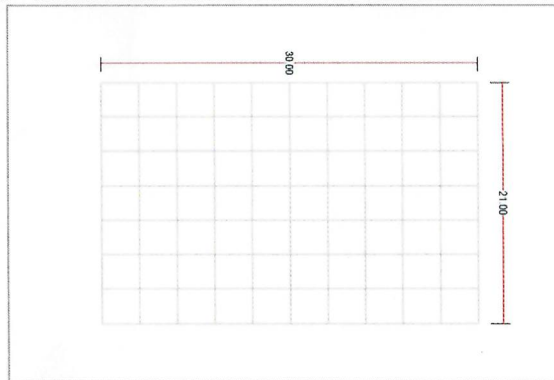

F4: Planta Arq. Plaza Cívica

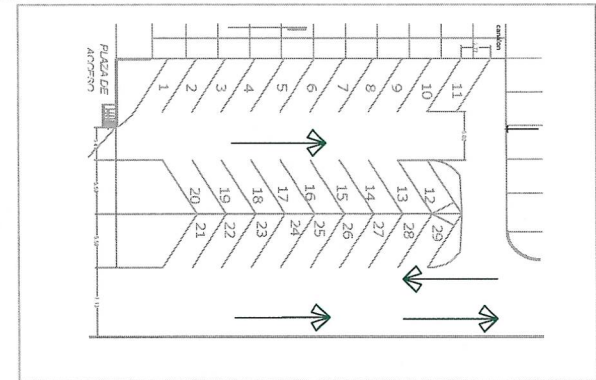

F5: Planta Arq. Estacionamiento

Lic. Gerardo Montero Pérez
Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
