



**Instituto
Campechano**



RECTORÍA
CORREO ELECTRÓNICO



OFICIO: RIC/1122/2023

ASUNTO: Informe FAM 3er. trimestre 2023

San Francisco de Campeche, camp., a 5 de octubre de 2023.

E-234749

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2023-0913-5 del 17 febrero del 2023, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 3er. trimestre del año en curso.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

- .C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
L.ic Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.C.P. Edward Elifar Santos Arce, Titular del OIC del I.C
Archivo.





**Instituto
Campechano**

RECTORÍA



OFICIO: RIC/1122/2023

ASUNTO: Informe FAM 3er. trimestre 2023

San Francisco de Campeche, camp., a 5 de octubre de 2023.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.**

En atención al oficio 511/2023-0913-5 del 17 febrero del 2023, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 3er. trimestre del año en curso.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

“Un pasado de gloria y un presente de luz”

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
L.ic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.C.P. Edwart Elifar Santos Arce, Titular del OIC del I.C
Archivo.



INSTITUTO CAMPECANO
 Ciudad: MIAMI, ESTADO DE CAMPECHE
 Avenida: Carretera Interamericana, km 602, 24010, Campeche, Campeche, México
 Teléfono: +52 (984) 451 1122 ext. 113
 Correo electrónico: informe@campeche.gob.mx




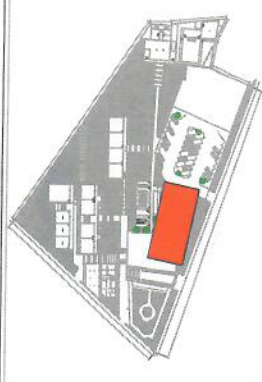
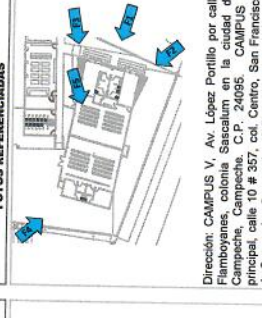
Identificación del Proyecto	Tipo de Proyecto		Código de Proyecto	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA			DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO			Ejecución de Actividades			Observaciones	Revisión y Aprobación		Acta	
	Subproyecto	Actividad		Fecha Programada	Monto Comprobado (B)	Comprobante	Monto de Compromiso (C) Autorización y Contrato (Caj. S)	Monto Aplicable (D)	Reservación (E) (20%)	Actividad	Avance	Fecha de Inicio		Fecha de Término	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Acta
1	Continuidad de actividades en el proyecto	Continuidad de actividades en el proyecto	00000001	01/05/2023	\$ 3,890,450.00	\$ 3,890,450.00	\$ 3,890,450.00	\$ 778,090.00	\$ 3,112,360.00	28.5%	05/05/23	05/10/23	05/05/23	05/10/23			
2	Continuidad de actividades en el proyecto	Continuidad de actividades en el proyecto	00000002	01/05/2023	\$ 3,443,476.00	\$ 3,443,476.00	\$ 3,443,476.00	\$ 688,695.20	\$ 2,754,780.80	47%	05/05/23	05/10/23	05/05/23	05/10/23			
3	Integración e implementación para la adquisición de equipos de laboratorio	Integración e implementación para la adquisición de equipos de laboratorio	00000003	15/05/2023	\$ 413,877.00	\$ 413,877.00	\$ 413,877.00	\$ 82,775.40	\$ 331,101.60	100%	15/05/23	15/05/23	15/05/23	15/05/23			
4	Elaboración de conceptos para el proyecto	Elaboración de conceptos para el proyecto	00000004	01/05/2023	\$ 475,671.00	\$ 475,671.00	\$ 475,671.00	\$ 95,134.20	\$ 380,536.80	20%	01/05/23	01/10/23	01/05/23	01/10/23			
							\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00								
							\$ 266,029.19	\$ 266,029.19	\$ 266,029.19								

Elaborado por: **LUZ LEON**
 Fecha de elaboración: 05/10/2023

Revisado por: **LUZ LEON**
 Fecha de revisión: 05/10/2023







Elaborado por: **LUZ LEON**
 Fecha de elaboración: 05/10/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE GUATEMALA</p>  <p>UN PASADO DE ORO UN FUTURO DE ORO</p>	<p>PROYECTO 1</p>	<p>Nombre de la obra: Continuidad construcción auditorio multifuncional en Campus V</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> 
<p>Porcentaje de avance 26.5%</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección: CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sasaculum en la ciudad de Campiche, Campiche, C.P. 24095, CAMPUS I de Iquip, calle 10 # 337, col. Centro, San Francisco de Campiche, Campiche, C.P. 24000</p>

FOTOS

Observaciones :

 <p>F1: FACHADA PRINCIPAL</p>	 <p>F2: LATERAL 1</p>	 <p>F3: INTERIOR AUDITORIO</p>
 <p>F4: FACHADA POSTERIOR</p>	 <p>F5: LATERAL 2</p>	 <p>F6: INTERIOR AUDITORIO</p>

<p>LUCELI BAUTISTA CAMACHO DISEÑO</p>	<p>DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN</p>	<p>LUCELI BAUTISTA CAMACHO EQUIPO DISEÑO</p>
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los obra. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas pesetas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adscripciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3ER. TRIMESTRE 2023

Fecha de elaboración: 08/10/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

GRUPO INSTITUCIONAL



PRIMORDIAL

2 Nombre de la obra:

Continuidad construcción aulas en Campus V

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección: CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24095. CAMPUS I de la UIC, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000

Porcentaje de avance

42%

FOTOS



F1: FACHADA PRINCIPAL



F2: LATERAL 1



F3: LATERAL 2



F4: FACHADA POSTERIOR



F5: VISTA EXTERIOR

P.O. LIC. SANDY RIVERA GONZALEZ CAMACHO

DRA. MARIBEL MAURITA AGUIRRE

LICDA. ELSA BETHEZ GARCERA ESPINOSA
SECRETARIA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastaria, se podrán copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adscripciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2023

EREGIO FISCAL EN EL OVE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3ER. TRIMESTRE 2023

Fecha de elaboración: 08/10/2023


UNIVERSIDAD



Nombre de la obra:
3

Integración e implementación para la migración de la infraestructura de red de cableado UTP de cobre a fibra óptica

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

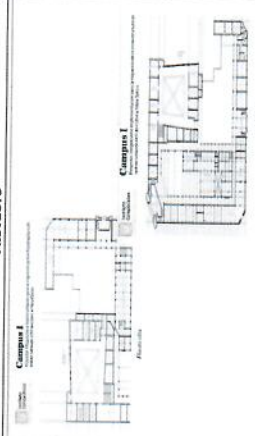

Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000



Porcentaje de avance:

100%

FOTOS



Observaciones:

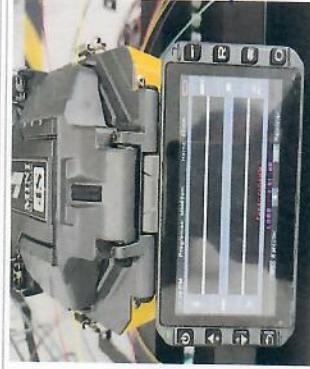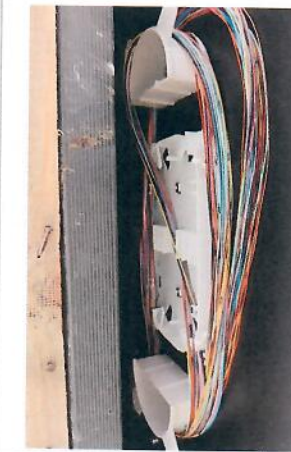

LUIS GONZALEZ FRAZ CAMACHO

DR. MARCELO ALVARO PLASCENCIA

LICDA. ILSA BAYRIZ CERVERA SCHUMBERG

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y discusiones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

ESQUEJO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3ER. TRIMESTRE 2023

Fecha de elaboración: 08/10/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE LA OBRA DEL AVANCE TRIMESTRAL

 <p>INSTITUCIÓN</p>	<p>PROYECTO</p> <p>4</p> <p>Nombre de la obra: Equipamiento de cómputo para el Laboratorio de idiomas</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 307, col Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000</p>

FOTOS		
Observaciones:		
 LIC. FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ	 DRA. IVÁNETH AMADOR VÁZQUEZ	 LICDA. LILA BEATRIZ CUEVAS ESCOBEDO

NOTA:
 * Es muy importante que se anexen fotos fotográficas de todos los avances. Para ello se anexa una planilla, se pueden copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en reportes, se recomienda que se capturen al menos 3 fotos, mismas que se capturan al inicio, durante y al finalizar la obra.
