



Instituto Campechano

RECTORÍA



OFICIO: RIC/388/2024

ASUNTO: Informe FAM 1er trimestre 2024

San Francisco de Campeche, camp., a 8 de abril de 2024.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención al oficio 511/2024-0622-6 del 7 febrero del 2024, firmado por la Dra. Carmen E. Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el cual informa la autorización de cinco proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 1er. trimestre del año 2024.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

CORREO ELECTRÓNICO



E-241798

- C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.
- Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
- Profr. Victor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
- Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI
- L.ic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
- Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
- C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
- L.C.P. Edwart Elifar Santos Arce, Titular del OIC del I.C
- Archivo.



Nombre: INSTITUTO CAMPECANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA

Nombre: Lic. Juan Carlos Pérez Cerna

REPORTES DE AVANCE

OTROS INFORMANTES

FECHA DE ELABORACIÓN

Nombre: INSTITUTO CAMPECANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA

Nombre: Lic. Juan Carlos Pérez Cerna

Cargo: Director General de Planeación y Control

Cargo: Director General de Planeación y Control

Celular electrónico: 9996666666

Celular electrónico: 9996666666

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Fechas Programadas, Monto asignado, Monto comprometido, Monto en Contratos, Monto en Compras, Monto en Ejecución, Estado de Ejecución, Comentarios, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Fecha de Emisión del Informe, Fecha de Emisión del Informe, Acta de Emisión del Informe, Fecha.

Signature area with blue ink signatures and official stamps.

Vertical text on the right side of the page, likely a date or reference number.

2024

EFECTIVO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Tercer trimestre y año que se reporta
1er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 03/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>UNIVERSIDAD DE YUCATÁN UN PASADO DE GRATIA ET IN</p>  <p>Procentaje de avance</p> <p>0.0%</p>	<p>PRONOSTIO 1</p> <p>Nombre de la obra:</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>Dotación de Mobiliario y equipo, a los espacios de Infraestructura física de recién edificación en el Instituto Campechano</p> <p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Albino</p> <p>Albino Campus IV</p> <p>Albino Campus V</p> <p>Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecotchakán Campeche CP 24800, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sasculum en la ciudad de Campeche, Campeche C.P. 24053.</p>
--	--	---	---

FOTOS

<p>F1:</p>	<p>F2:</p>	<p>Observaciones:</p> <p>El proyecto se encuentra en proceso de Gestión y Aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por lo que los trabajos no han iniciado</p>
<p>F3:</p>	<p>F4:</p>	<p>F5:</p>

LIC. ROBERTO ENRIQUE PEREZ GONZALEZ
OBRAS

DR. MARCELO SAULISTA ALVAREZ
ADMINISTRACION

LICDA. ILSA BEATRIZ CERQUEZA ESCOBAR
RECIBIDA

NOTA




* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

Trimestre y año que se reporta
1er. TRIMESTRE 2024
 Fecha de elaboración: 06/04/2024




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>USUARIO INSTITUCIÓN </p>	<p>PROYECTO 2 Nombre de la obra: Equipamiento de Laboratorios y/o Talleres de los Programas Educativos del nivel superior del Instituto Campechano</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecolotakan Campeche CP 24600; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Plumbóyenes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24000.</p>

FOTOS

<p>Observaciones:</p> <p>El proyecto se encuentra en proceso de Gestión y Aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por lo que los trabajos no han iniciado</p>	<p>F1:</p>	<p>F2:</p>
<p>F3:</p> <p>  LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CANJACIO OBRAS </p>	<p>F4:</p> <p>  Dra. MARIEL BAUTISTA AVILA PLANEACIÓN </p>	<p>F5:</p> <p>  LICDA. ELSA BEATRIZ HERRERA SÁNCHEZ E.C.O.P.P. </p>

NOTA
 Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

ERUDIO FISCAL EN EL QUE
SE USÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. TRIMESTRE 2024

Fecha de elaboración: 03/04/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD



Porcentaje de avance

0%

PROYECTO

Nombre de la obra:

Infraestructura de Tecnologías de la Información para la Innovación Educativa en los Campus I, II, IV y V

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchaján Campeche CP 24800; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24095.

FOTOS

Observaciones:

El proyecto se encuentra en proceso de Gestión y Aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por lo que los trabajos no han iniciado

LC. JORGE HERNÁNDEZ CARRILLO
OBRAS

DR. MARCELO BALBUENA GARCÍA
PLANIFICACIÓN

LICDA. ILESA MARÍA TERESA CHAVIERA BA
REC. Y ASES. ASES.

NOTA:








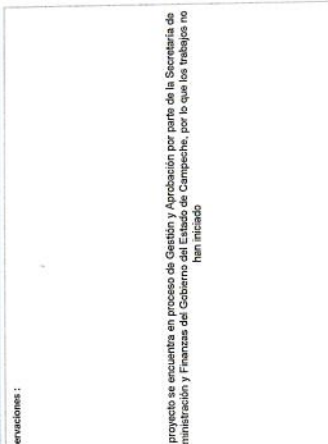




* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sean necesarias. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Trimestre y año que se reporta:
1er. TRIMESTRE 2024
 Fecha de elaboración: 06/04/2024

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

2024
 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
 OCURRIÓ EL RECIBO

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL Nombre de la obra: Continuidad de las aulas del Campus V del Instituto Campechano y obra exterior	
PROYECTO 4 GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	 <p>Dirección: CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Salicrú, en el Estado de Campeche, C.P. 24090.</p>
FOTOS	
	
	
Observaciones:	
	
El proyecto se encuentra en proceso de Gestión y Aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por lo que los trabajos no han iniciado	
 <p>LIC. JORGE CHÁVEZ PICHARDO OBRA</p>	 <p>DRA. MABEL DURAZO PLANIFICACIÓN</p>
 <p>LICDA. ILA MONITOREO Y EVALUACIÓN</p>	 <p>LICDA. ILA MONITOREO Y EVALUACIÓN</p>

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipararlas, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024
BENEFICARIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er. TRIMESTRE 2024
Fecha de elaboración: 08/04/2024

REPORTES FOTOGRAFICO DEL AVANCE DE AVANCE TRIMESTRAL	
PROYECTO	Nombre de la obra: Continuidad de la Infraestructura académica del Campus IV, Hecelchakán
PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIALES
<p>USO: EDUCACIÓN</p>  <p>Porcentaje de avance: 0%</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIALES</p> <p>Dirección: CAMPUS IV, Carretera Santa Cruz, Hecelchakán Campeche CP 24800</p>
<p>PROYECTO</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>CHOULIS POCROC SANTA CRUZ DZITNUP HECELCHAKAN</p>	<p>PROYECTO</p> <p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>Planta de conjunto de la obra con leyenda: 1. PLANTA DE CONJUNTO 2. SALIDA PARA MAESTROS 3. SALIDA PARA ALUMNOS 4. SALIDA PARA SERVIDORES</p>
FOTOS	
<p>Observaciones:</p>	<p>Observaciones:</p>
<p>El proyecto se encuentra en proceso de Gestión y Aprobación por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Campeche, por lo que los trabajos no han iniciado.</p>	
<p>LUIS ALBERTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN</p>	<p>LUIS ALBERTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN</p>
<p>LUIS ALBERTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN</p>	<p>LUIS ALBERTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN</p>
<p>LUIS ALBERTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN</p>	<p>LUIS ALBERTO BARRERA SECRETARIO DE EDUCACIÓN</p>

NOTA:
* En caso de que se haya iniciado el proyecto de la obra, se debe capturar las fotos de avance. Para ello se anexa una plantilla, se pueden capturar tantas fotos como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
