

---

**Re: [Externo] 3er. trimestre FAM ES 2022**

1 mensaje

**COMUNICADOS DFI** <dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx>

9 de octubre de 2022, 11:37

Para: Dirección General de Planeación y Calidad &lt;planeacion@instcamp.edu.mx&gt;

Con fundamento en el numeral tercero del "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril 2020, se acusa de recibida la información enviada a la Dirección de Fortalecimiento Institucional.

---

**De:** Dirección General de Planeación y Calidad <planeacion@instcamp.edu.mx>**Enviado:** viernes, 7 de octubre de 2022 02:48 p. m.**Para:** COMUNICADOS DFI <dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx>; Carmen E. Rodríguez Armenta <carmenta.r@nube.sep.gob.mx>; Luciano Concheiro Bórquez <luciano.concheiro@nube.sep.gob.mx>**CC:** María del Rocío Chávez Mayo <rociooc@nube.sep.gob.mx>; Carlos Enrique Sánchez Mendoza <cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx>; Jesus Carlos Villa Leal <jcarlosv@nube.sep.gob.mx>; Claudia Dueñas Ramírez <claudia.duenas@nube.sep.gob.mx>**Asunto:** [Externo] 3er. trimestre FAM ES 2022

---


**Precaución:** Este correo se originó desde fuera de la Institución. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y tenga conocimiento que el contenido es seguro.

---

Buen día

Anexo oficio RIC 659 del 5 octubre e Informe del 3er. trimestre (julio a septiembre 2022) de las obras apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022, en excel y PDF firmado

Favor de acusar de recibido

**DRA. MARIBEL BAUTISTA ÁLVAREZ***Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad*

Calle 10 No. 357 entre 63 y 65, Col Centro, C.P. 24000

San Francisco de Campeche, Campeche, México

Tel. directo 981 81 1 0397 Conmutador 981 81 6 62 14 Ext. 154

Correo: maribel.bautista@instcamp.edu.mx



Instituto  
Campechano

**RECTORÍA**



Oficio: RIC/ 659 / 2022.

Asunto: Informe FAM 3er. trimestre 2022

San Francisco de Campeche, Camp., 5 octubre de 2022

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ,  
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.  
PRESENTE.

En atención al oficio 511/2021-0826-05 del 18 de febrero del año 2022, enviado por la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural en el cual se notifica la autorización de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2022, proyecto: "Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchakán", por un monto asignado de \$11,249,169.00; mismo que indica el envío de informe de los avances del proyecto. Anexo, tengo a bien enviar USB con el informe del **3er. trimestre** del año 2022, en formato PDF y Excel.

Sin otro particular, le envió un saludo cordial.

"UN PASADO DE GLORIA Y UN PRESENTE DE LUZ"

ATENTAMENTE

*Gerardo*  
L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ  
RECTOR



**RECTORÍA**

C.c.p Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior.  
Dra. Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.  
M.C Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de Educación del Edo. de Campeche  
Mtra. María del Rocío Chávez Mayo, Subdirectora de Fomento Institucional DGESUI  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo, Directora General de Administración del IC  
M. C. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.  
C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.  
L.A.E Helga I. Cruz Segovia. - Titular del OIC del I.C

C.c.p archivo/ecs



2022

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

3er. TRIMESTRE

FECHA DE CORTE: JULIO A SEPTIEMBRE

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO

Entidad federativa: CAMPECHE

Clave Inst 911: 04MSU0030F

RESPONSABLES

Planación  
Nombre: M.C. Maribel Bautista Álvarez  
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad  
Teléfono: 981 81 10397 y 981 81 62480 Ext. 154  
Correo electrónico: planeacion@instcamp.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Cargo: Directora General de Administración  
Teléfono: 981 81 62480 Ext. 102 y 105  
Correo electrónico: servadm@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas														
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa												
GLOBAL DEL PROYECTO																																				
2	Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecalchakán	X					\$11,249,169.00	\$ 5,528,697.76	\$ 5,720,471.24	Aulas	6	311	SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE CIMENTACION DEL EDIFICIO B Y DE LA PLAZA CIVICA, ASI COMO LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO B Y LA NEVERIA. SE INICIARON LOS TRABAJOS DE RELLENO EN LA PLAZA CIVICA Y DE ESTRUCTURA EN LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO B.		51%	20/06/22	31/12/22	Según oficina INIFEEC/DG/DPPP/425/2022 del 22 septiembre se tiene un avance físico del 51%																		
									Áreas comunes (nevería, cocina, pasillos, escaleras, plaza cívica, estacionamiento y áreas verdes)	8	3758																									
									TOTAL	14	4069.00																									

\$11,249,169.00 \$5,528,697.76 \$5,720,471.24

Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Obras y Mantenimiento

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto, se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte físico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



#### REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRORIDAD **2**

Nombre de la obra: **Continuidad Construcción del edificio B, Campus IV, Hecelchaká**






Escudo de la universidad

Porcentaje de avance

# 51%

#### CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

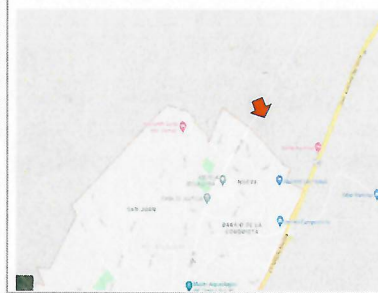

Referencia de fotos en croquis

#### UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección Postal: 24800 Carretera Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche.

#### FOTOS



F1: Edificio B



F2: Estacionamiento

#### Comentarios de los trabajos realizados:

Avance del 51 % de obra.



F3: Plaza Civica



F4: Nevería



F5: Carril de acceso

Lic. Gerardo Montero Pérez  
Nombre y firma del Titular de la IES

Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
