



Instituto Campechano
Rectoría



OFICIO: RIC/022/2026

ASUNTO: Informe FAM 4o. trimestre 2025

San Francisco de Campeche, camp., a 09 de enero de 2026.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2025-1347-08 del 14 de abril del 2025, mediante el cual informa la rectificación de tres proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025, en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel el informe correspondiente al 4o. trimestre del año 2025.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente

"Un pasado de gloria y un presente de luz"

Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA

C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior
Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
Prof. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho, Director General de Administración del IC
Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
C.P. Manuel Solís Denegri. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C.
Archivo

Calle 10 No. 357 Col. Centro C.P. 24000
Correo Electrónico: rectoria.ic@instcamp.edu.mx



2025

BUDGETO FISCAL EN EL QUE
SE REALIZA EL PAGO**FAM**
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

4o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 09/10/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

USO DE LA INSTITUCIÓN



Nombre INSTITUTO CAMPECHANO

Entidad federativa: 04 CAMPECHE

Clave 011 04MSU0020F

Planeación

Tribunales de Arre

Obras y Mantenimiento

Nombre: Dra. Mabel Bautista Álvarez
Cargo: Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono: 991 91 63460 Ext. 154
Correo electrónico: planeacion@inscamp.edu.mxNombre: Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
Cargo: Director General de Administración
Teléfono: 991 91 63460 Ext. 102 y 105
Correo electrónico: jorge.perez@inscamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto Reclamado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejercido (C)	REMANENTES		Especios físicos/equipamiento (programado/solicitado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (Diciembre/Año)		Observaciones	Reintegró a la TESOFE			Actas					
				No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre reclamado y Contratado C=A-B	(B1) Diferencia entre Monto Reclamado y Monto ejercido E1 = A-D	(B2) Diferencia entre Monto Contratado y Monto ejercido E2 = B-D	Nombre del Especialista/Grupo			Cantidad	Medios Cuadrados (m²)		Inicio	Termino	Linea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta Ingreso) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (Formo) DOESUJ MONTO	Fecha
					INICIO	TERMINO																					
1	Equipamiento de Laboratorios, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Nivel Superior del Instituto Campechano	X	\$ 1,976,890.78	INFEEC-ADO-FAM-ES-010-2025	29/09/2025	02/12/2025	\$ 430,795.63	Maria Georgina Heredia Tuniza			Salones de Clase	9	713.78			GLOBAL DEL PROYECTO											
				INFEEC-ADO-FAM-ES-011-2025	29/09/2025	02/12/2025	\$ 209,630.44	Patricia Urzarré Suárez			Laboratorios	2	157.50														
				INFEEC-ADO-FAM-ES-019-2025	24/11/2025	31/12/2025	\$ 685,639.75	Felipe Antonio Tamayo Díaz	\$ 0.00	\$63,885.91	\$ 992,871.87	\$ 692,871.87	Talleres	8	542.40	Contratos firmados/ Equipos recibidos	27.00	29/09/2025	31/12/2025								
				INFEEC-ADO-FAM-ES-019-2025	24/11/2025	31/12/2025	\$ 641,712.00	Felipe Antonio Tamayo Díaz																			
				INFEEC-ADO-FAM-ES-036-2025	19/12/2025	31/12/2025	\$ 8,862.96	Maria Georgina Heredia Tuniza																			
2	Construcción del Campus VI del Instituto Campechano	X	\$ 12,431,328.36	INFEEC-OP-FAM-ES-031-2025	28/07/2025	31/12/2025	\$ 11,274,585.85	Ingeniería y Servicios Especializados de Campeche SA de CV	\$ -	\$ 8,188,719.83	\$ 4,242,608.73	\$ 4,242,608.73	Salones de Clase	10	226.54			GLOBAL DEL PROYECTO									
							\$ 1,156,762.50																				
				INFEEC-OP-FAM-ES-031-1-2025			\$ 1,156,762.50																				
3	Equipamiento de los centros de información y documentación del Instituto Campechano	X	\$ 604,670.72	INFEEC-ADO-FAM-ES-010-2025	29/09/2025	02/12/2025	\$ 274,884.18	Maria Georgina Heredia Tuniza									GLOBAL DEL PROYECTO										
				INFEEC-ADO-FAM-ES-011-2025	29/09/2025	02/12/2025	\$ 142,993.20	Patricia Urzarré Suárez																			
				INFEEC-ADO-FAM-ES-019-2025	24/11/2025	31/12/2025	\$ 70,854.01	Maria Georgina Heredia Tuniza	\$ 0.15	\$ 274,110.10	\$ 430,966.62	\$ 430,966.47	Bibliotecas	2	335.00	Contratos firmados/Equipos recibidos	30.00	29/09/2025	31/12/2025								
				INFEEC-ADO-FAM-ES-019-2025	24/11/2025	31/12/2025	\$ 69,508.00	Felipe Antonio Tamayo Díaz																			
				INFEEC-ADO-FAM-ES-026-2025	17/12/2025	31/12/2025	\$ 57,197.28	Patricia Urzarré Suárez																			
				INFEEC-ADO-FAM-ES-036-2025	19/12/2025	31/12/2025	\$ 85,209.10	Maria Georgina Heredia Tuniza																			
\$15,192,895.86				\$15,192,895.71				\$0.15				\$9,446,816.84				\$5,056,047.22				\$5,056,047.07				4,799.08			

Lic. Jorge Enrique Pérez Camacho
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓNLicda. Mabel Bautista Álvarez
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDADDra. Mabel Bautista Álvarez
PLANEACIÓN

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance: 27.00%	PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: Equipamiento de Laboratorios, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Nivel Superior del Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS III Calle 12 # 126, col. Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.
--	---	---	--	---

FOTOS




Escuela de Ciencias de la Comunicación



Centro de Lenguas

Observaciones:

NINGUNA



Escuela de Artes Visuales

LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO
OBRAS Y MANTENIMIENTO

Escuela de Gastronomía

LICDA. ILSA ALICIA CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA

Escuela de Gastronomía

DRA. MARIBEL MARTÍNEZ ALVAREZ
PLANIFICACIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EMERGENCIA FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

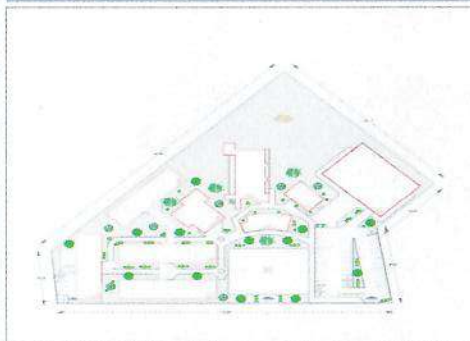
4o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 08/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

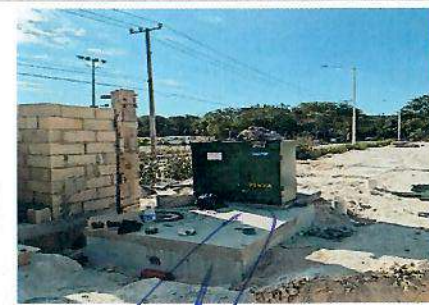
DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance 64.00%	PROPIEDAD 2 Nombre de la obra: Construcción del Campus VI del Instituto Campechano GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO  UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.
---	---

FOTOS



Observaciones:

Con fecha 24 de julio el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC) firma contrato para la ejecución del proyecto

LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO
OBRAS Y MANTENIMIENTOLICDA. ILSA BEATRIZ PERERA ECHEVERRÍA
DIRECCIÓNDRA. MARIBEL BARRERA ALVAREZ
DIRECCIÓN

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:



4o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 09/01/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance: 30.00%	PRIORIDAD: 3 Nombre de la obra: Equipamiento de los centros de información y documentación del Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093.
--	--	---	--	--

FOTOS

 Proyección Campus I	 Proyección Campus V	Observaciones:
 Bibliotecas  LIC. JORGE ENRIQUE PÉREZ CAMACHO OBRAS Y MANTENIMIENTO	 Bibliotecas  LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHAVERRÍA BIBLIOTECAS	 Bibliotecas y Hemeroteca  DRA. MARIBEL PINZÓN ÁLVAREZ BIBLIOTECAS

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postcard, se podrán copiar tantas postcard como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
