

2020



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Más reportado  
3er. TRIMESTRE  
FECHA DE CORTE: JULIO 2 SEPTIEMBRE

FINANCIAMIENTO MULTIPLES

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO



Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO  
Entidad Federativa: CAMPECHE  
Clave Inst: 31104MSU0309

Nombre: Ing. Abder Razaq Cobán León  
Cargo: Director General de Planeación y Cultura  
Teléfono: 991 81 10397 y 991 81 62480 E-4, 154  
Correo electrónico: planacion@institucio.edu.mx

Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Cargo: Director General de Administración  
Teléfono: 991 81 62480 E-4, 102 y 105  
Correo electrónico: administracion@institucio.edu.mx

Nombre: Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo  
Cargo: Director General de Administración  
Teléfono: 991 81 62480 E-4, 102 y 105  
Correo electrónico: administracion@institucio.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Atenciones del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Acta	Monto de Acta Administrativa	
		Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados			Inicio	Termino			¿Cuándo y cuándo fue inaugurado?	Entrega- Recepción (Acta Entrega- Recepción)			
1	Continuidad, Construcción del edificio A, Campus IV, Hecelchakán.	X				\$ 9,972,168.00	\$	\$ 9,972,168.00	Aulas	6	311											
									Bibliotecas	1	52											
									Oficinas académicas	1	8											
									Oficinas administrativas	1	8											
									Centro de estudio	1	52											
									Seminarios	3	58											
									Áreas comunes (gestiones interiores, escaleras, pasillos, estacionamientos, acciones)	8	1074											
									Otros (sala juntas, cocina, recepción, bodega, voladizo, estacionamiento)	6	2251											
									<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>3811.50</b>											

Nombre y Firma del Titular de la IES  
  
L.A.E. Gerardo Méndez Páez



Nombre y Firma del Titular de la IES  
  
Lic. María Elizabeth Fuentes Castillo

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden omitir áreas, áreas que no sean necesarias.  
2 En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.



Entidad: Universidad  
Porcentaje de avance

0%

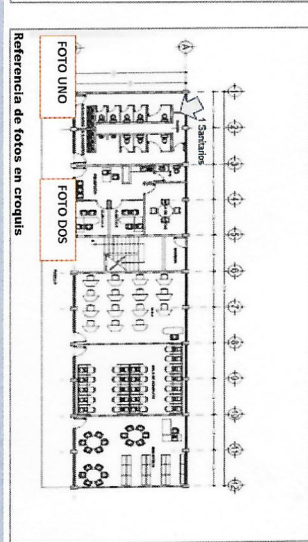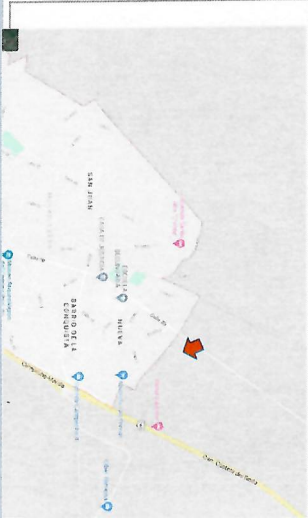

FOTOS

PROYECTO: **1** Nombre de la obra:

**Continuidad Construcción del edificio A, Campus IV, Hecechakán.**

CRUCIOS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Dirección Postal: 24800 Carretera Sant'a Cruz,  
Hecechakán, Campache.

Comentarios de los trabajos realizados:

Avance del 0 % de obra.



F1: Fachada principal




F2: lateral



F3: Fachada posterior



F4: Entrada

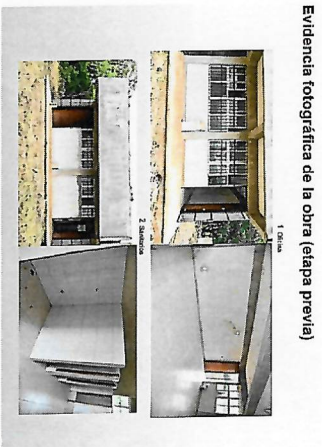

Evidencia fotográfica de la obra (etapa previa)

F5: Interior de aula

*Guerrero*  
Lic. Gerardo Guerrero Torres  
Nombre y firma del Titular de la IES

*Maria Elizabeth*  
Lic. Maria Elizabeth Muñoz Escobar  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán captar también planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
