



OFICIO: RIC/394/2026

ASUNTO: Informe FAM 5º TRIM 2025 y 1er TRIM 2026

San Francisco de Campeche, Camp., a 08 de abril de 2026

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL.
PRESENTE.

En atención a su oficio 511/2025-1347-08 del 14 de abril del 2025, mediante el cual informa la rectificación de tres proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2025, y oficio 511/2026-0587-07 del 23 de febrero 2026 informando la asignación de cuatro proyectos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026 en su componente de infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, y el compromiso del envío de los avances de los proyectos apoyados; anexo al presente me permito enviar en formato PDF y Excel los informes correspondientes al 5o. trimestre del año 2025 (Informe Final) y 1er trimestre del año 2026.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.

Atentamente
"Un pasado de gloria y un presente de luz"


Ilsa Beatriz Cervera Echeverría
Rectora del Instituto Campechano.



RECTORÍA



- C.c.p. Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Subsecretario de Educación Superior
- Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, Director General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.
- Prof. Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, Secretario de Educación del Edo. de Campeche
- Mtro. José Alonso Sagundo Rodríguez, Director General de Administración del IC
- Dra. Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad del IC.
- C.P. Manuel Solís Denegrí. - Director General Interino de Finanzas del I.C.
- L.A.F. Rosa Alejandra González Quintal, Titular del OIC del I.C
- Archivo

E-261703



REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre INSTITUTO CAMPECHEANO
Entidad federativa DE CAMPECHE
Clave 011 04MSU0030F

Planeación

Títulos de Área

Citas y Mantenimiento

Nombre Dra. Maribel Bautista Álvarez
Cargo Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Teléfono 961 91 62400 Ext. 154
Correo electrónico planeacion@instcamp.edu.mx

Nombre Mtro. José Alonso Sagundo Rodríguez
Cargo Director General de Administración
Teléfono 961 91 62400 Ext. 102 y 105
Correo electrónico jose.sagundo@instcamp.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Table with columns: Prioridad, Nombre del proyecto, Tipo de proyecto, Contrato y calendario de ejecución de la obra, Monto ejercido (D), Residuales, Espacios físicos/equipamiento, Fichas Reales, Observaciones, Retiro a la TESOFE, Actas.

MTR. JOSÉ ALONSO SAGUNDO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LICDA. LISA MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

5o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>DE LA INSTITUCIÓN</p> 	<p>PRORIDAD 1 Nombre de la obra: Equipamiento de Laboratorios, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los Programas Educativos del Nivel Superior del Instituto Campechano</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>100.00%</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 
<p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS III Calle 12 # 126, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascacum en la ciudad de Campeche, Campeche C.P. 24093.</p>		

FOTOS



Escuela de Ciencias de la Comunicación y Escuela de Mercadotecnia



Escuela de Artes Visuales

Observaciones :

Al 31 de Marzo 2026 se han recibido el 100 % de los equipos



Escuela de Educación Artística



Escuela de Gastronomía



Escuela de Trabajo Social


 MTRD. JOSÉ ALONZO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
 OBRAS Y MANTENIMIENTO


 LICDA. ELSA MARÍA CERVANTES ECHEVERRÍA
 RECTORÍA


 DRA. NUBEL BAUTISTA ÁLVAREZ
 PLANEACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM




FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Trimestre y año que se reporta:
5o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN 	PRIORIDAD: 2 Nombre de la obra: Construcción del Campus VI del Instituto Campechano		
Porcentaje de avance: 100.00%	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.

FOTOS

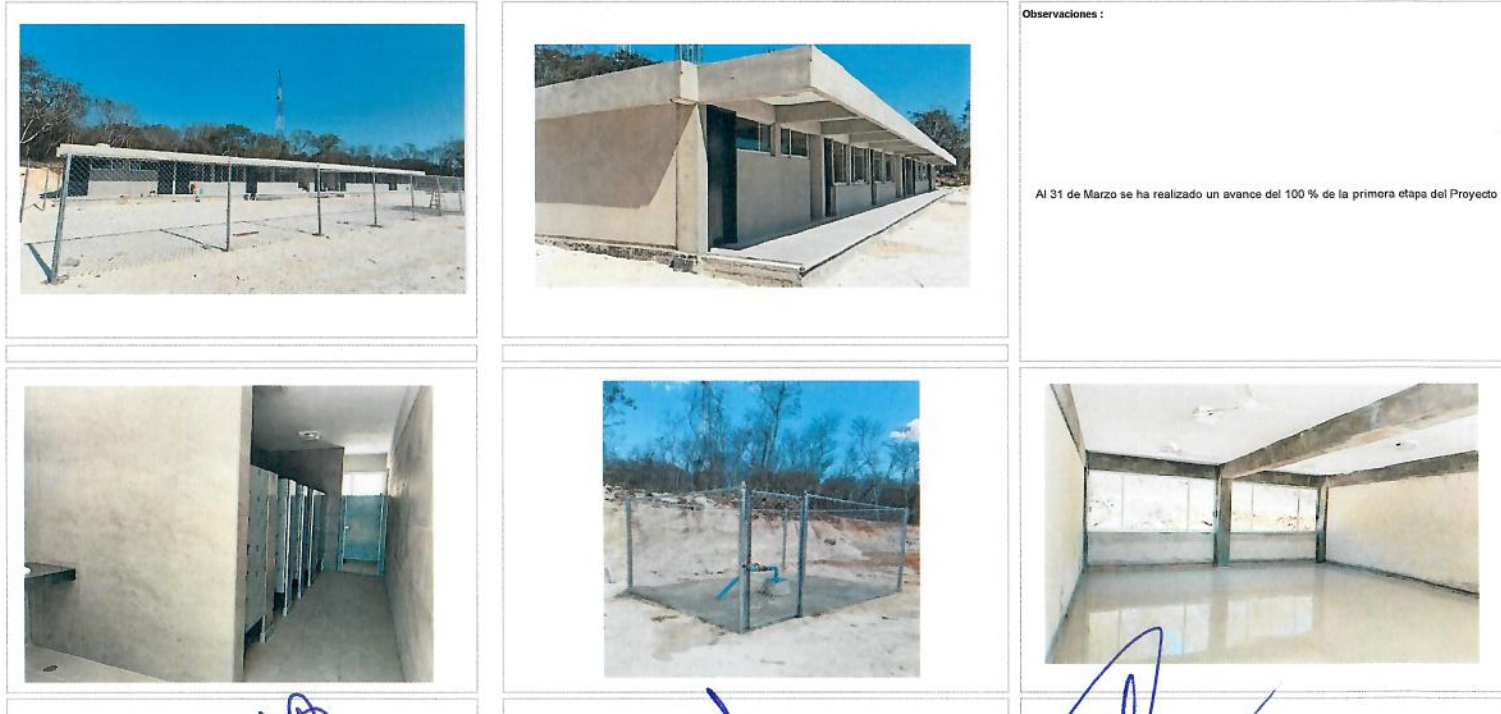

Observaciones:

Al 31 de Marzo se ha realizado un avance del 100% de la primera etapa del Proyecto


MRO. JOSÉ ALFREDO AGUANDO RODRÍGUEZ
OBRA Y MANTENIMIENTO


LETICIA MATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA
RECTORÍA


MARÍA DEL BAUTISTA ÁLVAREZ
PLANEACIÓN

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

5o TRIMESTRE 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance: 100.00%	PRIORIDAD: 3 Nombre de la obra: Equipamiento de los centros de información y documentación del Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascatum en la ciudad de Campeche, Campeche, C.P. 24093.
---	---	---	--	---

FOTOS



Bibliotecas



Bibliotecas

Observaciones:



Hemeroteca

MTRO. JOSÉ ALBERTO GUINDO RODRIGUEZ
OBRA Y EQUIPAMIENTO



Bibliotecas

LICDA. ILSA BETTEZ CASEREA ECHEVERRÍA
SECRETARÍA



Bibliotecas y Hemeroteca

CIUDA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ
PLANACIÓN

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA INSTITUCIÓN		DATOS DE LA UNIVERSIDAD	
Nombre: INSTITUTO CAMPECHANO			
Termino Trimestral: 04 CAMPECHE			
Clave del proyecto: 04050202P			
Nombre: Dña. Marcela Guadalupe Álvarez Cargo: Encargada de la Dirección Central de Planeación y Control Teléfono: 991 81 8240 Ect. 154 Correo electrónico: pplaneacion@icamp.edu.mx		Nombre: Mtro. José Alonso Sagundo Rodríguez Cargo: Director General de Administración Teléfono: 991 81 62480 Ext. 482 y 405 Correo electrónico: jose.sagundo@camp.edu.mx	

Prioridad	ID de acuerdo con el SFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA					Monto ejecutado (D)	Remanente (E) (B-D)	Espacios de equipamiento (programa/autorizada)			Antes de iniciar el avance	% de avance	Fechas Finales		Observaciones	Rendimiento a la TERCERA			Actos															
					No. (a) de Contrato (a)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista			Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado (A-B-C)	Nivel de Equipamiento	Capacidad			Nivel Financiero	Inicio		Termino	Línea de Cultura	Proyecto	Estrategia-Recurso (Año y monto)	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recpción (Año y monto)	Fecha												
						INICIO	TERMINO																				Línea de Cultura	Proyecto	Estrategia-Recurso (Año y monto)	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recpción (Año y monto)	Fecha						
					GLOBAL DEL PROYECTO																																	
		1	Continuidad del Equipamiento de Aulas, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los programas educativos del Instituto Campechano	X	\$ 5 434 017 00					\$ 5 434 017 00	\$ 5 434 017 00																											
		3	Continuidad de la Construcción del Campus VI del Instituto Campechano	X	\$ 18 593 941 00					\$ 18 593 941 00	\$ 18 593 941 00																											
			Proyecto para la Inclusión y la Equidad Educativa en el Instituto Campechano	X	\$ 634 007 00					\$ 634 007 00	\$ 634 007 00																											
		5	Continuidad del Equipamiento de los Centros de Información y Documentación del Instituto Campechano	X	\$ 1 835 701 00					\$ 1 835 701 00	\$ 1 835 701 00																											
					\$18,444,959.00						\$0.00	\$18,444,959.00	\$0.00	\$18,444,959.00																								

Mtro. José Alonso Sagundo Rodríguez


Dña. Marcela Guadalupe Álvarez


Licda. Elsa Beatriz Torres Escobedo


2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:


1er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 05/04/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LA INSTITUCIÓN  LOSOSES Porcentaje de avance 0.0%	PROYECTO 1 Nombre de la obra: Continuidad del Equipamiento de Aulas, Talleres e Infraestructura Tecnológica de los programas educativos del Instituto Campechano	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000, CAMPUS III Calle 12 # 126, col Centro San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sasculum en la ciudad de Campeche, Campeche C.P. 24093 Campus VI Calle Juan Escutia S/N, Colonia Buenavista en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24030
---	--	---	--	--

FOTOS

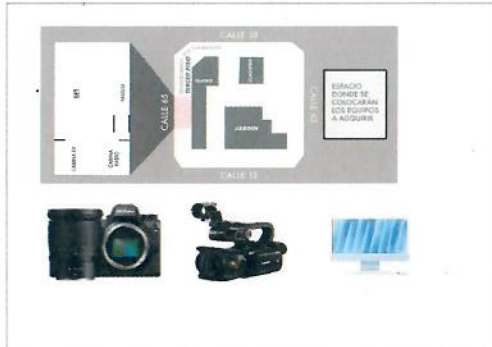


Escuela de Ciencias de la Comunicación



Escuela de Mercadotecnia

Observaciones:

Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de rectificación

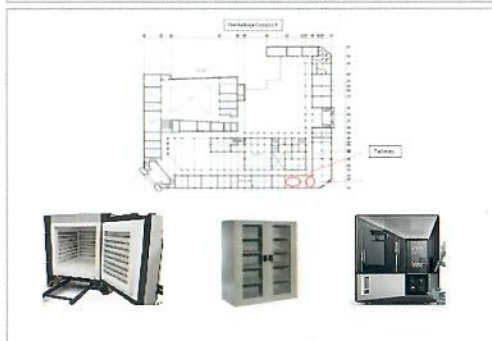

Escuela de Artes Visuales



Escuela de Gastronomía



Escuela de Restauración

MTRO. JOSÉ ALONSO FERRANDO RODRIGUEZ OBRAS

DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN

LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 08/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


<p>LA INSTITUCIÓN</p> 	<p>UBICACIÓN</p>	<p>PRIORIDAD</p>	<p>2</p>	<p>Nombre de la obra: Continuidad de la Construcción del Campus VI del Instituto Campechano</p>	
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>		<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>		<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
				<p>Dirección: CAMPUS VI, Calle Juan Escutia S/N, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24030.</p>	

FOTOS



Observaciones :

Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de rectificación

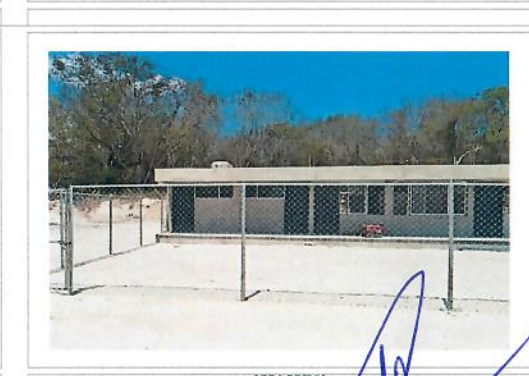


 INTRO. JOSÉ ALBERTO GUINDO RODRÍGUEZ OBRAS


 DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN


 LICDA. ILSA BEATRIZ VERVERA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Trimestre y año que se reporta
1er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración 08/04/2026

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


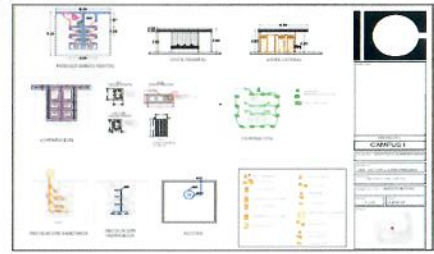
<p>LA INSTITUCIÓN</p> 	<p>PROYECTO</p> <p>3</p>	<p>Nombre de la obra: Proyecto para la Inclusión y la Equidad Educativa en el Instituto Campechano</p>		<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 		<p>Dirección CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000</p>

FOTOS

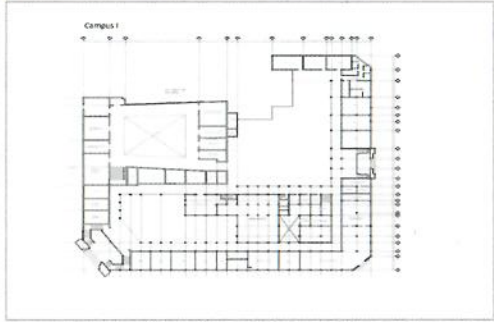

Observaciones :

Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de rectificación




MTRG. JOSÉ ALONSO RODRÍGUEZ OBRAS


DRA. MARIBEL BAUTISTA ALVAREZ PLANEACIÓN


LICDA. ILSA BEATRIZ CERVERA ECHEVERRÍA REC.TORA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2026

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. TRIMESTRE 2026

Fecha de elaboración: 08/04/2026

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LA INSTITUCIÓN</p> 	<p>PRECISIÓN 5</p>	<p>Nombre de la obra: Continuidad del Equipamiento de los Centros de Información y Documentación del Instituto Campechano</p>	
<p>Porcentaje de avance</p> <p>0%</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p> <p>Dirección: CAMPUS I principal, calle 10 # 357, col. Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P. 24000; CAMPUS V, Av. López Portillo por calle Flamboyanes, colonia Sascalum en la ciudad de Campeche, Campeche. C.P. 24093</p>

FOTOS



Campus I



Campus V

Observaciones:

Se ha firmado Convenio de Colaboración con el INIFEEC, los proyectos se encuentran en proceso de rectificación



Proyección Campus I



Proyección Campus V



Equipamiento Bibliotecas y Hemeroteca

MTR. JOSÉ ALONSO SAGUÁN RODRÍGUEZ OBRAS

DRA. MARIBEL BARRANTI ALVAREZ PLANEACIÓN

LICDA. ILSA BEATRIZ SIVERA ECHEVERRÍA RECTORA

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
